

Documentation gestion de projet — EcoRide

1. Méthodologie

1.1 Approche choisie : Agile / Kanban

Le projet EcoRide a été conduit selon une approche **Kanban** combinée à des principes Agile :

- Découpage du besoin en **User Stories** (US) numérotées
- Priorisation : du visiteur (US 1-7) vers les rôles privilégiés (US 8-13)
- **Itérations courtes** : une US codée et testée avant de passer à la suivante
- Branche Git par fonctionnalité, merge dans `develop` après tests, puis dans `main` pour livraison

1.2 Pourquoi pas Scrum ?

Le projet étant porté par un développeur unique, les cérémonies Scrum (sprint planning, daily, retro) n'apportent pas de valeur. Le **Kanban** offre la flexibilité nécessaire avec un suivi visuel simple.

2. Outil de gestion : Kanban

Le tableau est tenu dans un fichier `kanban.md` pour porter facilement vers Trello/Notion.

2.1 Colonnes


1. **Backlog** — toutes les fonctionnalités prévues, par ordre de priorité
2. **À faire** — fonctionnalités planifiées pour la semaine en cours
3. **En cours** — fonctionnalité actuellement développée (limite WIP : 1)
4. **Terminé sur develop** — testé et mergé sur `develop`
5. **Mergé sur main** — déployé en production

2.2 Règles de gestion

- **Limite WIP** : une seule US "En cours" à la fois
- Une US sur **develop** doit être testée localement avant de passer
- Une US sur **main** doit être validée par déploiement réussi sur Railway

3. Workflow Git

3.1 Stratégie de branches

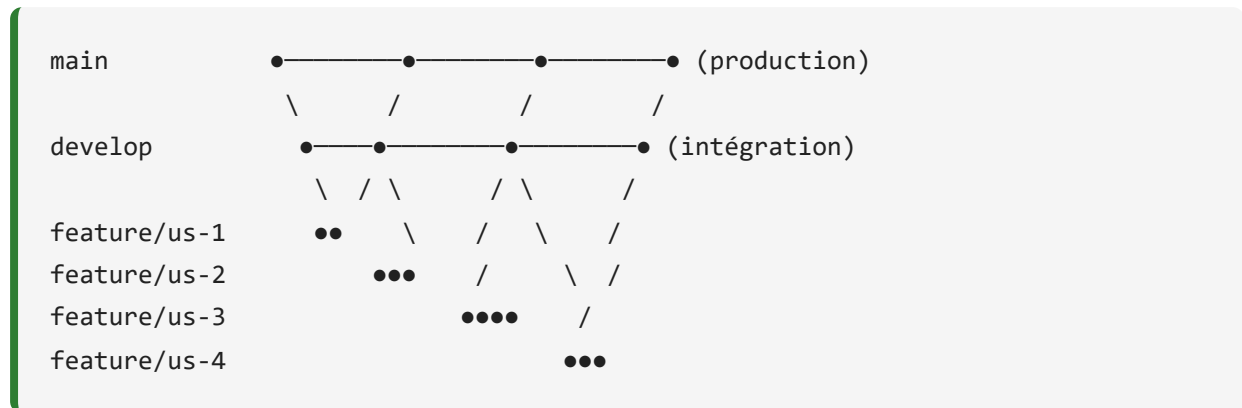

3.2 Convention de nommage

- Branches : `feature/us-N-courte-description` (ex : `feature/us-3-recherche-covoiturages`)
- Commits : préfixés par `feat:` , `fix:` , `docs:` , `chore:` , `refactor:` , `test:`
- PR / merge : titre court + description détaillée des changements

3.3 Cycle de vie d'une fonctionnalité

1. `git checkout develop && git pull`
2. `git checkout -b feature/us-N-description`
3. Développer + tester en local
4. `git commit -m "feat: ..."`
5. `git push origin feature/us-N-description`
6. Merge dans `develop` (ou via Pull Request si revue)
7. Tests sur `develop`
8. Merge `develop` dans `main` après validation

4. Découpage des user stories

4.1 Priorisation MoSCoW

Priorité	US	Description
MUST	1, 2, 3, 5, 7	Bases : voir, rechercher, créer un compte
MUST	6, 9, 10	Cœur métier : participer, proposer, gérer
SHOULD	4, 8, 11	Filtres, espace utilisateur, démarrage

Priorité	US	Description
SHOULD	12, 13	Modération + administration
COULD	(futur)	Messagerie, géoloc, paiement

4.2 Estimation et suivi

US	Difficulté	Heures estimées	Heures réelles
1	★	2 h	2 h
2	★	1 h	1 h
3	★★★★	8 h	6 h
4	★★	4 h	3 h
5	★★	5 h	4 h
6	★★★★	6 h	5 h
7	★★	3 h	3 h
8	★★★★	7 h	6 h
9	★★	4 h	4 h
10	★★	4 h	3 h
11	★★★★	6 h	5 h
12	★★	4 h	3 h
13	★★★★	8 h	6 h
Total		62 h	51 h

(Reste : maquettes, doc, déploiement = ~19h, total prévu 70h conforme à la consigne.)

5. Risques identifiés et mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
MongoDB non accessible en local	Haute	Moyen	Fallback gracieux dans les Models (try/catch) + Atlas pour la prod
Mots de passe non robustes	Moyenne	Élevé	Validation côté serveur + indication côté UI

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Race conditions sur places dispo	Faible	Élevé	Transaction MySQL avec <code>SELECT ... FOR UPDATE</code>
Crédits négatifs	Faible	Élevé	Vérification atomique avant débit dans la transaction
XSS sur commentaires/avis	Moyenne	Élevé	Échappement systématique via <code>e()</code>

6. Tests

6.1 Tests réalisés (manuels)

- ✓ Toutes les routes visiteur (HTTP 200)
- ✓ Login admin → redirection /admin
- ✓ Login utilisateur → /mon-espace
- ✓ Création de compte → 20 crédits offerts
- ✓ Recherche covoiturage avec filtres
- ✓ Page détail covoiturage (avec et sans MongoDB)
- ✓ Pages employé et admin (rôles requis)
- ✓ API JSON `/admin/api/stats` (graphiques)

6.2 Tests automatisés (à venir)

- PHPUnit pour les Models (couches d'accès aux données)
- Tests d'intégration des controllers

7. Livrables

Livable	Format	Statut
Code source	Dépôt GitHub public	✓ (à pousser)
Application déployée	URL Railway	À faire
README.md	Markdown	✓
Manuel d'utilisation	PDF	✓ (en MD, à exporter)
Charte graphique	PDF	✓ (en MD, à exporter)
Wireframes / Mockups	PDF	À faire (3 desktop + 3 mobile)
Documentation gestion projet	PDF	✓ (ce fichier)

Livable	Format	Statut
Documentation technique	PDF	✓
Scripts SQL	<code>.sql</code>	✓
Kanban	Trello/Notion + <code>kanban.md</code>	✓ (MD), à porter
